


**Plaats, datum:**  
Haarle, 7 februari 2023

**Betreft:**  
Aankondiging werkzaamheden korfbalveld C.S.V. Dindoa

Geachte heer, mevrouw,

Middels deze brief willen Sallandse United en Stichting Sporthal Dindoa u informeren over de komende werkzaamheden.

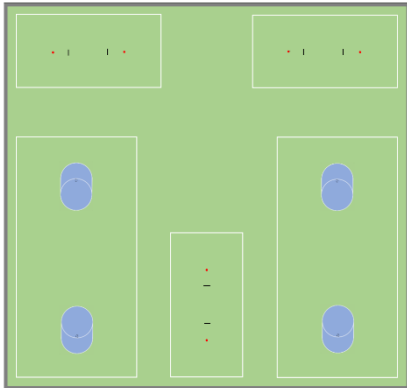

#### **Wat gaan we doen;**

Na jaren van intensief gebruik zijn de korfbalvelden C.S.V. Dindoa aan vervanging toe. Sallandse United en Stichting Sporthal Dindoa hebben hiervoor gezamenlijk een plan opgesteld en gaan de bestaande kunstgrasmat vervangen door een nieuw exemplaar. Het nieuwe veld wordt geheel ingericht conform de eisen van de KNKV en NOC\*NSF en zal straks plaats bieden aan 3 jeugdvelden en 2 seniorenvelden. De ovals van de seniorenvelden zullen in blauw worden uitgevoerd. De bestaande dug-outs worden verplaatst en het hekwerk wordt voorzien van kantplanken en nieuwe poorten.

#### **Nieuw kunstgras;**

Stichting Sporthal Dindoa heeft besloten het nieuwe veld uit te voeren in een 'zandkunstgrasveld korfbal 2.0' Deze velden onderscheiden zich van de traditionele zandvelden doordat ze minder en een fijnere gradatie infill zand, en meer kunstgrasvezels bevatten. Het instrooizand wordt tot net onder de top van de vezel ingestrooid. Hierdoor speelt het comfortabeler dan de traditionele kunstgrasmatten, die bezand worden. Resultaat is een sporttechnisch sneller zandveld met een groen speeloppervlak met blauwe ovals.

#### **Planning werkzaamheden**

**Week 10 (6-10 maart);** Het oude kunstgras zal worden verwijderd. Hiervoor wordt eerst het zand uit de kunstgrasmat geklopt waarna deze wordt opgerold en afgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zal het kunstgras en het zand tijdelijk op het parkeerterrein op depot worden gelegd. Dit depot zal worden afgeschermd met hoge bouwhekken. Tevens controleren we of de drainage nog goed functioneert.

**Week 11 (13-17 maart);** We herstellen al het straatwerk aan de binnenzijde van het leunhekwerk zodat er een vloeiende overgang met het nieuwe kunstgras ontstaat. Ook herstellen we een aantal verzakkingen in het looppad rondom het veld.

Tevens profileren we de laag welke onder het kunstgras zit, zodat deze weer aan de eisen van NOC\*NSF voldoet.

**Week 12 (20-24 maart);** We installeren het nieuwe kunstgras en strooien het in met zand. Tevens passen we het hekwerk aan en plaatsen wij nieuwe grondpotten voor de korven.

#### **Verwachte overlast**

We zullen de overlast voor gebruikers en omgeving tot een minimum te beperken. Met name in week 10 en 12 zal er aan- afvoer van materialen zijn. Deze laten we zo veel mogelijk just- in time leveren. Helaas kunnen we niet voorkomen dat we sommige materialen tijdelijk op zullen moeten slaan. Om werk- en bouwverkeer te scheiden wordt er een veilige oversteek gecreëerd. Zie hiervoor de bijgevoegde uitvoeringstekening.

#### **Vragen;**

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan gerust contact op met uitvoerder Roel Nijland, hij staat u graag te woord. Roel is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 - 17.00 uur via: 06 -137 150 75 Of stuur een email naar: [r.nijland@sallandsewegaanbouw.com](mailto:r.nijland@sallandsewegaanbouw.com)

